

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20250325/WL/01	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania:	BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI
Metoda/procedura badawcza:	pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7
Zleceniodawca:	Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski ul. Partyzancka 9b 66-200 Świebodzin
Kontrakt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Badany obiekt:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Pobranie:	
Nr zlecenia:	
Identyfikacja materiału wg Zleceniodawcy:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Identyfikacja materiału wg Laboratorium:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Miejsce badania:	P1 - 0+200 str. Prawa
Data badania:	24.03.2025
Orzeczenie:	-
Uwagi:	-
Załączniki:	-

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

	TER6	
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20210325/WL/01	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 2/2		

Nazwa badania:
Metoda/procedura badawcza:
Zlecniodawca:
Nazwa kontraktu:
Miejsce badania:
Data badania:

BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI
pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7
Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin
Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
P1 - 0+200 str. Prawa
24.03.2025

Grubość warstwy [cm]	Rodzaj warstwy	Czy występują warstwy smołowe
1	2	3
6	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa	NIE
6	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa	TAK
10	Stabilizacja	-

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20250325/WL/02	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania:	BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI
Metoda/procedura badawcza:	pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7
Zlecniodawca:	Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski ul. Partyzancka 9b 66-200 Świebodzin
Kontrakt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Badany obiekt:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Pobranie:	
Nr zlecenia:	
Identyfikacja materiału wg Zlecniodawcy:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Identyfikacja materiału wg Laboratorium:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Miejsce badania:	P2 - 1+100 str. Lewa
Data badania:	24.03.2025
Orzeczenie:	-
Uwagi:	-
Załączniki:	-

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

	TER6	
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
Nr sprawozdania:STER7/20210325/WL/02		
Laboratorium WMB/ Połowe Szczecin-Gorzów		
ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin		
tel. 727 550 576		
wiktor.lechowicz@eurovia.pl		
Strona 2/2		

Nazwa badania:

BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI

Metoda/procedura badawcza:

pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7

Zlecniodawca:

Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin

Nazwa kontraktu:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu

Miejsce badania:

P2 - 1+100 str. Lewa

Data badania:

24.03.2025

Grubość warstwy [cm]	Rodzaj warstwy	Czy występują warstwy smołowe
1	2	3
9	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa	TAK
8	Stabilizacja	-

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20250325/WL/03	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania:	BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI
Metoda/procedura badawcza:	pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7
Zlecniodawca:	Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski ul. Partyzancka 9b 66-200 Świebodzin
Kontrakt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Badany obiekt:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Pobranie:	
Nr zlecenia:	
Identyfikacja materiału wg Zlecniodawcy:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Identyfikacja materiału wg Laboratorium:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Miejsce badania:	P3 - 2+100 str. Prawa
Data badania:	24.03.2025
Orzeczenie:	-
Uwagi:	-
Załączniki:	-

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

	TER6	
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20210325/WL/03	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 2/2		

Nazwa badania:
Metoda/procedura badawcza:
Zlecniodawca:
Nazwa kontraktu:
Miejsce badania:
Data badania:

BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI
pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7
Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin
Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku tagów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
P3 - 2+100 str. Prawa
24.03.2025

Grubość warstwy [cm]	Rodzaj warstwy	Czy występują warstwy smołowe
1	2	3
12	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa	TAK
14	Kostka kamienna	-

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20250325/WL/04	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania:	BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI
Metoda/procedura badawcza:	pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7
Zlecniodawca:	Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski ul. Partyzancka 9b 66-200 Świebodzin
Kontrakt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Badany obiekt:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Pobranie:	
Nr zlecenia:	
Identyfikacja materiału wg Zlecniodawcy:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Identyfikacja materiału wg Laboratorium:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Miejsce badania:	P4 - 3+000 str. Lewa
Data badania:	24.03.2025
Orzeczenie:	-
Uwagi:	-
Załączniki:	-

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

	TER6	
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20210325/WL/04	
	Laboratorium WMB/ Połowe Szczecin-Gorzów ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 2/2		

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI**
Metoda/procedura badawcza: pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7
Zlecniodawca: Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin
Nazwa kontraktu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Miejsce badania: P4 - 3+000 str. Lewa
Data badania: 24.03.2025

Grubość warstwy [cm]	Rodzaj warstwy	Czy występują warstwy smołowe
1	2	3
13	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa	TAK
około 15	Kruszywo grube łamane	-

KONIEC SPRAWOZDANIA

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20250325/WL/05	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania:	BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI
Metoda/procedura badawcza:	pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7
Zlecniodawca:	Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski ul. Partyzancka 9b 66-200 Świebodzin
Kontrakt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Badany obiekt:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Pobranie:	
Nr zlecenia:	
Identyfikacja materiału wg Zlecniodawcy:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Identyfikacja materiału wg Laboratorium:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Miejsce badania:	P5 - 4+100 str. Prawa
Data badania:	24.03.2025
Orzeczenie:	-
Uwagi:	-
Załączniki:	-

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

	TER6	
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20210325/WL/05	
	Laboratorium WMB/ Połowe Szczecin-Gorzów ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 727 550 576	
	wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 2/2		

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI**

Metoda/procedura badawcza: pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7

Zlecniodawca: Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin

Nazwa kontraktu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu

Miejsce badania: P5 - 4+100 str. Prawa

Data badania: 24.03.2025

Grubość warstwy [cm]	Rodzaj warstwy	Czy występują warstwy smołowe
1	2	3
11	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa	TAK
około 13	Kruszywo drobne łamane	-

KONIEC SPRAWOZDANIA

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20250325/WL/06	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania:	BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI
Metoda/procedura badawcza:	pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7
Zlecniodawca:	Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski ul. Partyzancka 9b 66-200 Świebodzin
Kontrakt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Badany obiekt:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Pobranie:	
Nr zlecenia:	
Identyfikacja materiału wg Zlecniodawcy:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Identyfikacja materiału wg Laboratorium:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Miejsce badania:	P6 - 5+000 str. Lewa
Data badania:	24.03.2025
Orzeczenie:	-
Uwagi:	-
Załączniki:	-

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

		TER6	
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ			
Nr sprawozdania: STER7/20210325/WL/06			
Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów			
ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin			
tel. 727 550 576			
wiktor.lechowicz@eurovia.pl			
Strona 2/2			

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI**

Metoda/procedura badawcza: pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7

Zleceniodawca: Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin

Nazwa kontraktu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu

Miejsce badania: P6 - 5+000 str. Lewa

Data badania: 24.03.2025

Grubość warstwy [cm]	Rodzaj warstwy	Czy występują warstwy smołowe
1	2	3
8	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa	TAK
około 14	Kruszywo grube łamane	-

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20250325/WL/07	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania:	BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI
Metoda/procedura badawcza:	pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7
Zlecniodawca:	Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski ul. Partyzancka 9b 66-200 Świebodzin
Kontrakt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Badany obiekt:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Pobranie:	
Nr zlecenia:	
Identyfikacja materiału wg Zlecniodawcy:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Identyfikacja materiału wg Laboratorium:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Miejsce badania:	P7 - 6+100 str. Prawa
Data badania:	24.03.2025
Orzeczenie:	-
Uwagi:	-
Załączniki:	-

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

		TER6	
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ			
Nr sprawozdania: STER7/20210325/WL/07			
Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów			
ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin			
tel. 727 550 576			
wiktor.lechowicz@eurovia.pl			
Strona 2/2			

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI**

Metoda/procedura badawcza: pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7

Zlecniodawca: Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin

Nazwa kontraktu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu

Miejsce badania: P7 - 6+100 str. Prawa

Data badania: 24.03.2025

Grubość warstwy [cm]	Rodzaj warstwy	Czy występują warstwy smołowe
1	2	3
10	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa	TAK
około 12	Kruszywo grube łamane	-

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER7/20250325/WL/08	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania:	BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI
Metoda/procedura badawcza:	pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7
Zlecniodawca:	Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski ul. Partyzancka 9b 66-200 Świebodzin
Kontrakt	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Badany obiekt:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Pobranie:	
Nr zlecenia:	
Identyfikacja materiału wg Zlecniodawcy:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Identyfikacja materiału wg Laboratorium:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Miejsce badania:	P8 - 7+100 str. Lewa
Data badania:	24.03.2025
Orzeczenie:	-
Uwagi:	-
Załączniki:	-

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

		TER6	
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ			
Nr sprawozdania: STER7/20210325/WL/08			
Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów			
ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin			
tel. 727 550 576			
wiktor.lechowicz@eurovia.pl			
Strona 2/2			

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU NAWIERZCHNI DROGI**

Metoda/procedura badawcza: pobrano z zagęszczonej warstwy metodą wiercenia wg PN-EN 12697-27, pkt 4.7

Zlecniodawca: Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin

Nazwa kontraktu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu

Miejsce badania: P8 - 7+100 str. Lewa

Data badania: 24.03.2025

Grubość warstwy [cm]	Rodzaj warstwy	Czy występują warstwy smołowe
1	2	3
4	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa	TAK
około 14	Kruszywo grube łamane	-

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER6/20250325/WL/01	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU GEOLOGICZNEGO - ODWIERT GEOLOGICZNY**

Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntów

Zlecniodawca: Usługi Inżynierskie
Marcin Marchlewski
ul. Partyzancka 9b
66-200 Świebodzin

Kontrakt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu

Badany obiekt: Grunt rodzimy

Pobranie:

Nr zlecenia:

Identyfikacja materiału Grunt rodzimy

wg Zlecniodawcy:

Identyfikacja materiału Grunt rodzimy

wg Laboratorium:

Miejsce badania: P1 - 0+200 str. Prawa

Data badania: 24.03.2025

Orzeczenie: -


Uwagi: -

Załączniki: -

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

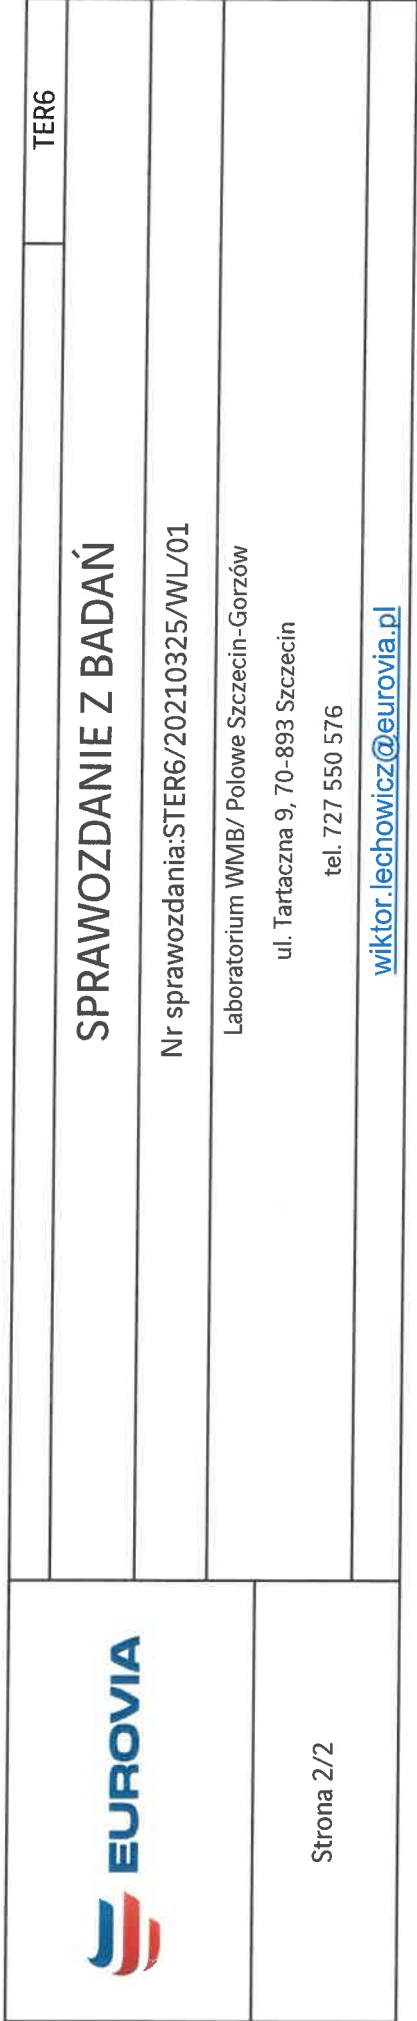

Nazwa badania:	BADANIE PROFILU GEOLOGICZNEGO - ODWIERT GEOLOGICZNY
Metoda/procedura badawcza:	PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntów
Zleceńiodawca:	Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin
Nazwa kontraktu:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łagów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Miejsce badania:	P1 - 0+200 str. Prawa
Data badania:	24.03.2025

KONIEC SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie z audytu **EUROVIA** **Sp. z o.o.** **z siedzibą w Katowicach**
Kierownik Laboratorium Polowego
W. Lechowicz
Wiktor Lechowicz

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER6/20250325/WL/02	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU GEOLOGICZNEGO - ODWIERT GEOLOGICZNY**

Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntów

Zlecniodawca: Usługi Inżynierskie
Marcin Marchlewski
ul. Partyzancka 9b
66-200 Świebodzin

Kontrakt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu

Badany obiekt: Grunt rodzimy

Pobranie:

Nr zlecenia:

Identyfikacja materiału Grunt rodzimy

wg Zlecniodawcy:

Identyfikacja materiału Grunt rodzimy

wg Laboratorium:

Miejsce badania: P2 - 1+100 str. Lewa

Data badania: 24.03.2025

Orzeczenie: -

Uwagi: -

Załączniki: -

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

	TER6	
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER6/20210325/WL/02	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 2/2		

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU GEOLOGICZNEGO - ODWIERT GEOLOGICZNY**
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntów
Zleceniodawca: Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin
Nazwa kontraktu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łagów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Miejsce badania: P2 - 1+100 str. Lewa
Data badania: 24.03.2025

Przelot - poniżej dna robót ziemnych [cm]	Profil litologiczny	Głębokość zwiarcia wody nawierconej [cm]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność [%]	Stan gruntu spółistego
1	2	3	4	5	6	7
0-10		-	Humus	H	-	-
10-120		-	Piasek drobny	Pd	wilgotny	-

KONIEC SPRAWOZDANIA

**EUROVIA**
Laboratorium wykonawcze
Kierownik Laboratorium Polowego
W. Lechowicz
Wiktor Lechowicz

**EUROVIA**
Laboratorium wykonawcze
Kierownik Laboratorium Polowego
W. Lechowicz
Wiktor Lechowicz

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER6/20250325/WL/03	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU GEOLOGICZNEGO - ODWIERT GEOLOGICZNY**

Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntów

Zleceniodawca: Usługi Inżynierskie
Marcin Marchlewski
ul. Partyzancka 9b
66-200 Świebodzin

Kontrakt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu

Badany obiekt: Grunt rodzimy

Pobranie:

Nr zlecenia:

Identyfikacja materiału Grunt rodzimy

wg Zleceniodawcy:

Identyfikacja materiału Grunt rodzimy

wg Laboratorium:

Miejsce badania: P3 - 5+000 str. Lewa

Data badania: 24.03.2025

Orzeczenie: -

Uwagi: -

Załączniki: -

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

		TER6	
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ			
Nr sprawozdania: STER6/20210325/WL/03			
Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów			
ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin			
tel. 727 550 576			
wiktor.lechowicz@eurovia.pl			

Strona 2/2

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU GEOLOGICZNEGO - ODWIERT GEOLOGICZNY**
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntów
Zleceniodawca: Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin
Nazwa kontraktu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łagów - Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Miejsce badania: P3 - 5+000 str. Lewa
Data badania: 24.03.2025

Przelot - poniżej dna robót ziemnych [cm]	Profil litologiczny	Głębokość zwierciadła wody nawierconej [cm]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność [%]	Stan gruntu spoiстого
1	2	3	4	5	6	7
0-20		-	Humus	H	-	-
20-70		-	Piasek drobny	Pd	wilgotny	-
70-120		-	Piasek pylisty	Pπ	wilgotny	-

KONIEC SPRAWOZDANIA

 **EUROVIA**
Kierownik Laboratorium Polowego
WIKTOR LECHOWICZ
Wiktor Lechowicz

 **EUROVIA**
Sprawozdanie wykonat/a:
Kierownik Laboratorium Polowego
WIKTOR LECHOWICZ
Wiktor Lechowicz

	Data: 25.03.2025	TER6
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER6/20250325/WL/04	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 091 462 13 10, kom. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/2 P19 - Zał. 2		
Wydanie II 10.01.2012		
Edycja IV 02.12.2013		

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU GEOLOGICZNEGO - ODWIERT GEOLOGICZNY**

Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntów

Zleceniodawca: Usługi Inżynierskie
Marcin Marchlewski
ul. Partyzancka 9b
66-200 Świebodzin

Kontrakt: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu

Badany obiekt: Grunt rodzimy

Pobranie:

Nr zlecenia:

Identyfikacja materiału Grunt rodzimy

wg Zleceniodawcy:

Identyfikacja materiału Grunt rodzimy

wg Laboratorium:

Miejsce badania: P4 - 7+100 str. Lewa

Data badania: 24.03.2025

Orzeczenie: -

Uwagi: -

Załączniki: -

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

	TER6	
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania:STER6/20210325/WL/04	
	Laboratorium WMB/ Polowe Szczecin-Gorzów ul. Tartaczna 9, 70-893 Szczecin tel. 727 550 576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 2/2		

Nazwa badania: **BADANIE PROFILU GEOLOGICZNEGO - ODWIERT GEOLOGICZNY**
Metoda/procedura badawcza: PN-B-04481:1988 p. 3.2. oznaczanie rodzaju gruntów
Zleceniodawca: Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewskiul. Partyzancka 9b66-200 Świebodzin
Nazwa kontraktu: Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łągów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Miejsce badania: P4 - 7+100 str. Lewa
Data badania: 24.03.2025

Przelot - poniżej dna robót ziemnych [cm]	Profil litologiczny	Głębokość zwierciadła wody nawierconej [cm]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność [%]	Stan gruntu spoilstego
1	2	3	4	5	6	7
0-20		-	Humus	H	-	-
20-120		-	Piasek pylasty	Pπ	wilgotny	-

KONIEC SPRAWOZDANIA

**EUROVIA**
Badanie wykonat/a:
Kierownik Laboratorium Polowego
Wiktora Lechowicza
Wiktor Lechowicz

**EUROVIA**
Sprawozdanie autoryzował/a:
Kierownik Laboratorium Polowego
Wiktora Lechowicza
Wiktor Lechowicz

	Data: 25.03.2025	TER3
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER3/20250325/WL/01	
	Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. ul. Tartaczna 9 , 70-893 Szczecin tel. 727-550-576 wiktor.lechowicz@eurovia.pl	
Strona 1/6		

Nazwa badania:	BADANIE UGIĘCIA NAWIERZCHNI BELKĄ BENKELMANA
Metoda/procedura badawcza:	BN-8931-06:1970 pomiar ugięć nawierzchni podatnych ugięciomierzem belkowym
Zlecniodawca:	Usługi Inżynierskie Marcin Marchlewski ul. Partyzancka 9b 66-200 Świebodzin
Kontrakt:	Przebudowa drogi powiatowej nr 1236F i 1221F na odcinku Łagów – Sieniawa (kierunek Wielowieś) do granicy powiatu
Badany obiekt:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Identyfikacja materiału wg Zlecniodawcy:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Identyfikacja materiału wg Laboratorium:	Istniejąca nawierzchnia asfaltowa
Miejsce badania:	odcinek drogi Łagów – Sieniawa
Data badania:	25.03.2025
Orzeczenie:	-
Uwagi:	Waga samochodu : 10000kg
Załączniki:	-

Przedstawione wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp. EUROVIA Polska S.A. sprawozdanie z badań nie może być powielone inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie z badań jest własnością Klienta dla którego wykonano badania. Informacje zawarte w sprawozdaniu mogą być wykorzystane tylko za zgodą właściciela.

	Data: 25.03.2025	TER3
	SPRAWOZDANIE Z BADAN	
	Nr sprawozdania: STER3/20250325/WL/01	
	Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp.	
	ul. Tartaczna 9 , 70-893 Szczecin	
Strona 2/6	tel. 727-550-576	
	wikt.lechowicz@eurovia.pl	

Nacisk na koło: 50,0kN

Temperatura nawierzchni: 16,0 °C

Lp.	Strona jezdni	kilometraż	Ugięcie sprężystee [mm]
1	prawa	0+000	0,24
2	lewa	0+020	0,16
3	prawa	0+046	0,64
4	oś	0+068	0,18
5	oś	0+094	0,32
6	lewa	0+117	0,2
7	prawa	0+139	0,26
8	oś	0+163	0,28
9	oś	0+184	0,24
10	lewa	0+205	0,58
11	prawa	0+222	0,32
12	oś	0+238	0,32
13	prawa	0+253	0,5
14	lewa	0+270	0,26
15	oś	0+289	0,3
16	oś	0+309	0,5
17	prawa	0+334	0,42
18	lewa	0+361	0,68
19	oś	0+390	0,32
20	oś	0+416	0,32
21	prawa	0+442	0,16
22	lewa	0+472	0,42
23	oś	0+498	0,14

Lp.	Strona jezdni	kilometraż	Ugięcie sprężystee [mm]
24	oś	0+528	0,34
25	prawa	0+560	0,14
26	lewa	0+588	0,50
27	oś	0+622	0,30
28	oś	0+658	0,18
29	prawa	0+685	0,30
30	lewa	0+720	0,36
31	oś	0+752	0,20
32	oś	0+787	0,20
33	prawa	0+817	0,36
34	lewa	0+852	0,30
35	oś	0+886	0,26
36	oś	0+919	0,20
37	prawa	0+959	0,18
38	lewa	0+991	0,46
39	oś	1+027	0,14
40	oś	1+066	0,30
41	prawa	1+098	0,92
42	lewa	1+131	0,28
43	oś	1+163	0,42
44	oś	1+195	0,26
45	prawa	1+225	0,42
46	lewa	1+254	0,26

	Data: 25.03.2025	TER3
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER3/20250325/WL/01	
	Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp.	
	ul. Tartaczna 9 , 70-893 Szczecin	
Strona 3/6	tel. 727-550-576	
	wiktoria.lechowicz@eurovia.pl	

Nacisk na koło: 50,0kN

Temperatura nawierzchni: 16,0 °C

Lp.	Strona jezdni	kilometraż	Ugięcie sprężyste [mm]
1	oś	1+288	0,24
2	oś	1+320	0,3
3	prawa	1+352	0,44
4	lewa	1+387	0,32
5	oś	1+423	0,14
6	oś	1+459	0,32
7	prawa	1+493	0,4
8	lewa	1+527	0,24
9	oś	1+569	0,28
10	oś	1+618	0,26
11	prawa	1+660	0,54
12	lewa	1+704	0,48
13	prawa	1+744	0,3
14	lewa	1+784	0,48
15	oś	1+820	0,28
16	oś	1+856	0,28
17	prawa	1+895	0,16
18	lewa	1+931	0,26
19	oś	1+973	0,16
20	oś	2+018	0,14
21	prawa	2+066	0,16
22	lewa	2+110	0,2
23	oś	2+154	0,22

Lp.	Strona jezdni	kilometraż	Ugięcie sprężyste [mm]
24	oś	2+193	0,12
25	prawa	2+241	0,14
26	lewa	2+284	0,26
27	oś	2+326	0,16
28	oś	2+370	0,22
29	prawa	2+421	0,26
30	lewa	2+467	0,34
31	oś	2+510	0,28
32	oś	2+552	0,18
33	prawa	2+593	0,44
34	lewa	2+634	0,40
35	oś	2+668	0,28
36	oś	2+703	0,22
37	prawa	2+744	0,30
38	lewa	2+780	0,26
39	oś	2+822	0,18
40	oś	2+854	0,28
41	prawa	2+891	0,78
42	lewa	2+928	0,26
43	oś	2+967	0,18
44	oś	3+008	0,44
45	prawa	3+045	0,22
46	lewa	3+081	0,56

	Data: 25.03.2025	TER3
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER3/20250325/WL/01	
	Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp.	
Strona 4/6	ul. Tartaczna 9 , 70-893 Szczecin	
	tel. 727-550-576	
	wiktor.lechowicz@eurovia.pl	

Nacisk na koło: 50,0kN

Temperatura nawierzchni: 16,0 °C

Lp.	Strona jezdni	kilometraż	Ugięcie sprężystee [mm]
1	oś	3+122	0,28
2	oś	3+158	0,22
3	prawa	3+198	0,54
4	lewa	3+235	0,36
5	prawa	3+265	0,24
6	oś	3+316	0,28
7	prawa	3+358	0,32
8	lewa	3+400	0,68
9	oś	3+437	0,3
10	oś	3+480	0,34
11	prawa	3+515	0,26
12	lewa	3+553	0,4
13	oś	3+593	0,16
14	oś	3+629	0,38
15	prawa	3+662	0,44
16	lewa	3+697	0,46
17	oś	3+732	0,36
18	oś	3+776	0,84
19	prawa	3+810	0,9
20	lewa	3+840	0,96
21	oś	3+878	0,3
22	oś	3+916	0,38
23	prawa	3+955	0,08

Lp.	Strona jezdni	kilometraż	Ugięcie sprężystee [mm]
24	lewa	3+991	0,48
25	oś	4+029	0,22
26	oś	4+062	0,16
27	prawa	4+105	0,42
28	lewa	4+147	0,28
29	oś	4+188	0,24
30	oś	4+235	0,24
31	prawa	4+273	0,62
32	lewa	4+312	0,22
33	oś	4+354	0,32
34	oś	4+395	0,22
35	prawa	4+438	0,34
36	lewa	4+471	0,14
37	oś	4+510	1,10
38	oś	4+551	0,22
39	prawa	4+593	0,34
40	lewa	4+638	0,22
41	oś	4+684	0,34
42	oś	4+729	0,24
43	prawa	4+779	0,40
44	lewa	4+823	0,16
45	oś	4+865	0,36
46	oś	4+906	0,18

	Data: 25.03.2025	TER3
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER3/20250325/WL/01	
	Laboratorium WMB / Połowe Szczecin - Gorzów Wlkp.	
Strona 5/6	ul. Tartaczna 9 , 70-893 Szczecin	
	tel. 727-550-576	
	wikt.lechowicz@eurovia.pl	

Nacisk na koło: 50,0kN

Temperatura nawierzchni: 16,0 °C

Lp.	Strona jezdni	kilometraż	Ugięcie sprężystee [mm]
1	prawa	4+942	0,36
2	lewa	4+990	0,7
3	oś	5+047	0,14
4	oś	5+095	0,28
5	prawa	5+144	0,26
6	lewa	5+184	0,22
7	oś	5+227	0,2
8	oś	5+268	0,18
9	prawa	5+303	0,24
10	lewa	5+338	0,18
11	oś	5+375	0,24
12	oś	5+405	0,24
13	prawa	5+435	0,04
14	lewa	5+463	0,58
15	oś	5+494	0,28
16	oś	5+526	0,24
17	prawa	5+565	0,56
18	lewa	5+608	0,06
19	oś	5+643	0,2
20	oś	5+680	0,28
21	prawa	5+719	0,2
22	lewa	5+751	0,04
23	oś	5+783	0,14

Lp.	Strona jezdni	kilometraż	Ugięcie sprężystee [mm]
24	oś	5+827	0,18
25	prawa	5+864	0,24
26	lewa	5+895	0,22
27	oś	5+930	0,14
28	oś	5+974	0,20
29	prawa	6+007	0,08
30	lewa	6+047	0,16
31	oś	6+085	0,26
32	oś	6+131	0,20
33	prawa	6+170	0,38
34	lewa	6+201	0,20
35	oś	6+236	0,20
36	oś	6+271	0,24
37	prawa	6+312	0,48
38	lewa	6+342	0,34
39	oś	6+372	0,06
40	oś	6+402	0,26
41	prawa	6+433	0,40
42	lewa	6+460	0,26
43	prawa	6+488	0,26
44	prawa	6+512	0,44
45	lewa	6+542	0,16
46	lewa	6+570	0,24

	Data: 25.03.2025	TER3
	SPRAWOZDANIE Z BADAŃ	
	Nr sprawozdania: STER3/20250325/WL/01	
	Laboratorium WMB / Polowe Szczecin - Gorzów Wlkp.	
Strona 6/6	ul. Tartaczna 9 , 70-893 Szczecin	
	tel. 727-550-576	
	wiktory.lechowicz@eurovia.pl	

Nacisk na koło: 50,0kN

Temperatura nawierzchni: 16,0 °C

Lp.	Strona jezdni	kilometraż	Ugięcie sprężyste [mm]
1	prawa	6+597	0,28
2	lewa	6+631	0,30
3	prawa	6+670	0,20
4	lewa	6+702	0,62
5	prawa	6+739	0,50
6	lewa	6+773	0,28
7	prawa	6+813	0,60
8	oś	6+852	0,36
9	prawa	6+889	0,74
10	lewa	6+925	0,30
11	prawa	6+970	0,62
12	oś	6+997	0,56
13	oś	7+034	0,54
14	lewa	7+066	0,34
15	prawa	7+106	0,34
16	lewa	7+138	0,60
17	prawa	7+174	0,70
18	oś	7+204	0,54
19	prawa	7+236	0,32
20	lewa	7+275	0,58
21	prawa	7+320	0,46
22	lewa	7+362	0,86
23	oś	7+403	0,34
24	lewa	7+446	0,48
25	prawa	7+480	0,44

Lp.	Strona jezdni	Kilometraż	Ugięcie sprężyste [mm]
26	lewa	7+523	0,4
27	oś	7+567	0,38
28	lewa	7+605	0,4
29	oś	7+650	0,48
30	lewa	7+702	0,52
31	prawa	7+730	0,48
32	oś	7+750	0,3
33	-	-	-
34	-	-	-
35	-	-	-
36	-	-	-
37	-	-	-
38	-	-	-
39	-	-	-
40	-	-	-
41	-	-	-
42	-	-	-
43	-	-	-
44	-	-	-
45	-	-	-
46	-	-	-
47	-	-	-
48	-	-	-
49	-	-	-
50	-	-	-

Średnie ugięcie sprężyste	0,33
Odchylenie standardowe ugięć sprężystych [mm]	0,18
Miarodajne ugięcie sprężyste	0,68
Współczynnik temperaturowy	1,08
Współczynnik sezonowości	1,00
Współczynnik podbudowy	1,00
Ugięcie obliczeniowe	0,74

Graniczna wartość ugięć [mm]	KR1	0,85
	KR2	0,7
	KR3	0,6
	KR4	0,5

wg. KPRNPP-2013

KONIEC SPRAWOZDANIA
