

15.05.2023

PROGRAM PRAC BUDOWLANYCH KOŚCIOŁA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
JEZUSOWEGO W WIŚNIEWIE, GM. WIŚNIEW, WPISANEGO DO GMINNEJ
EWIDENCJI ZABYTKÓW.

Opracowano na zlecenie – Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Wiśniewie.

Opracowanie zawiera:

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu.
2. Założenia.
3. Program prac.

*oprac.
T. Kamiński
Konservator Dziej. Sztuki*

WOJEWODZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW
W WARSZAWIE
Delegatura w Siedlcach
08-110 Siedlce, ul. Bema 4a
05/633-56-29, fax: 025/633-94-58

ZAŁĄCZNIK DO PISMA


Nr Ds. 5152.108.2023.Bt

Z dnia 19.06.2023r.


1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. 1 Wnętrze kościoła, widok na prezbiterium. [styczeń, 2023r.]

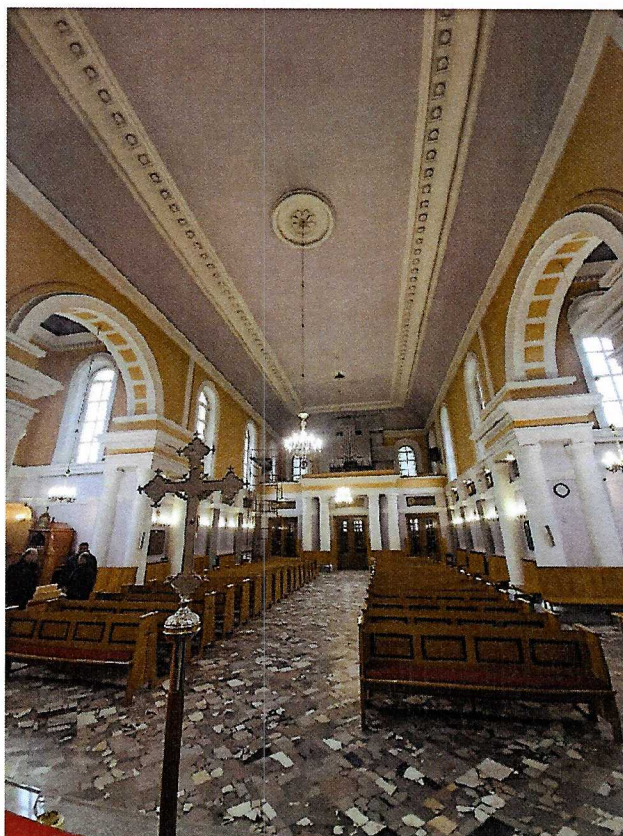


Fot. 2 Wnętrze kościoła, widok z prezbiterium na nawę główną. [styczeń, 2023r.]

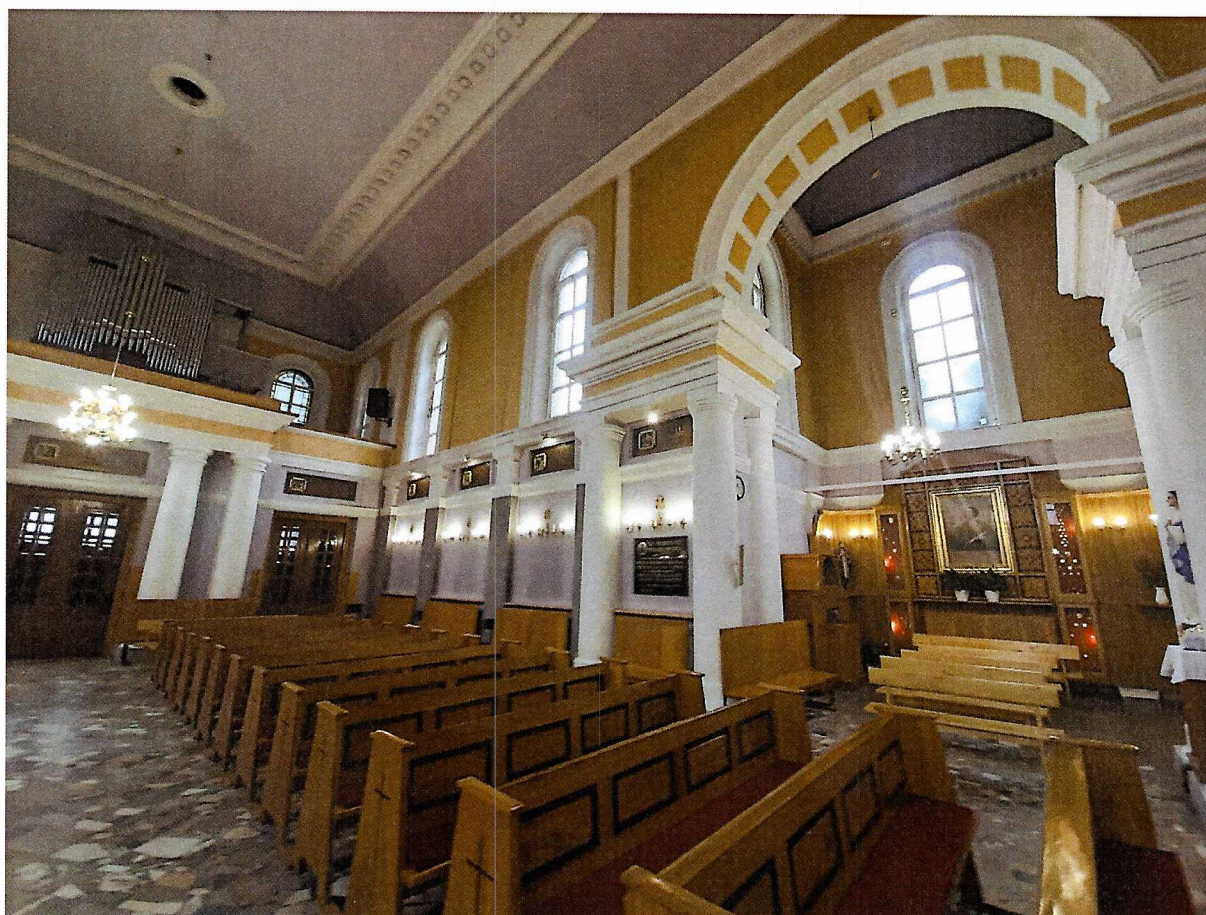


Fot.3 Wnętrze kościoła, widok z nawy głównej na nawę boczną. [styczeń, 2023r.]

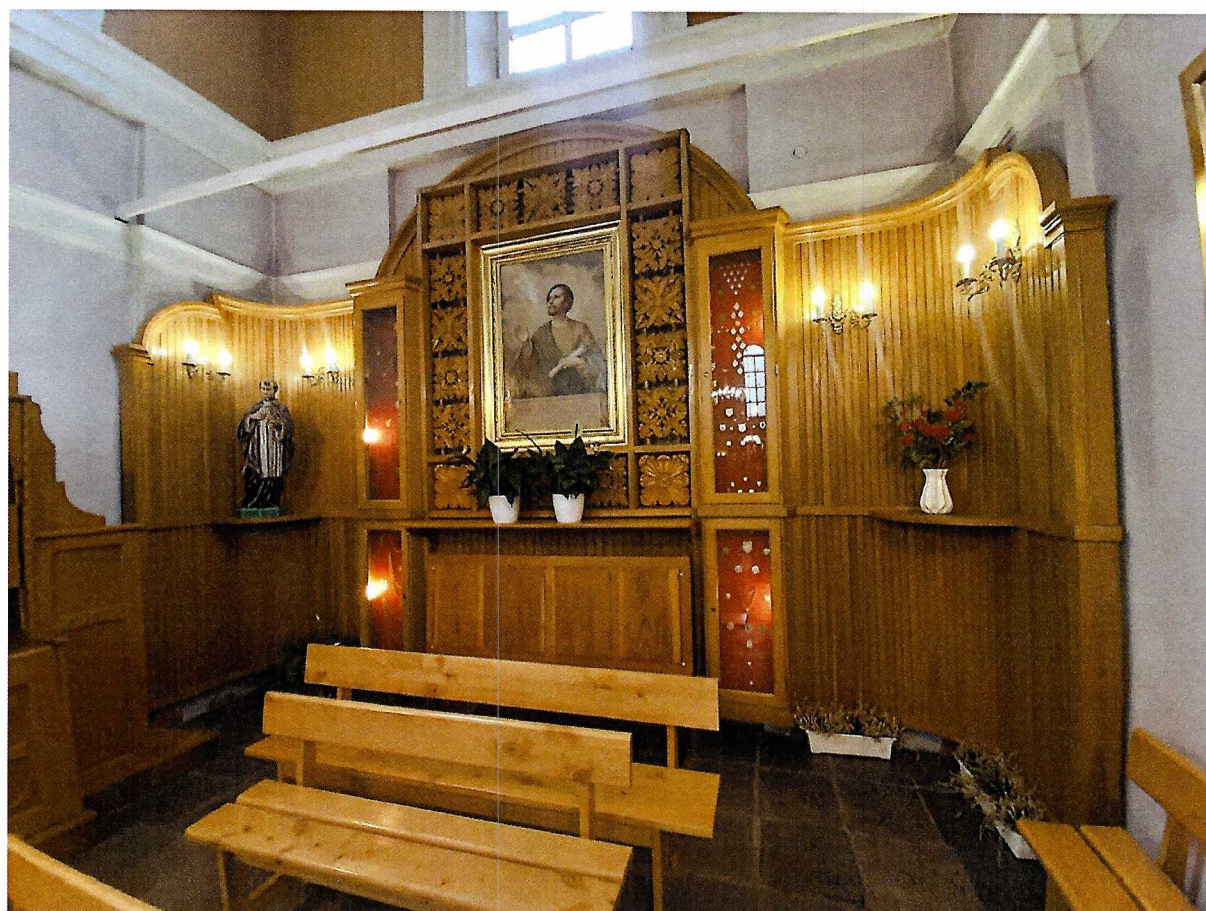


Fot. 4 Wnętrze kościoła, nawa boczna. [styczeń, 2023r.]

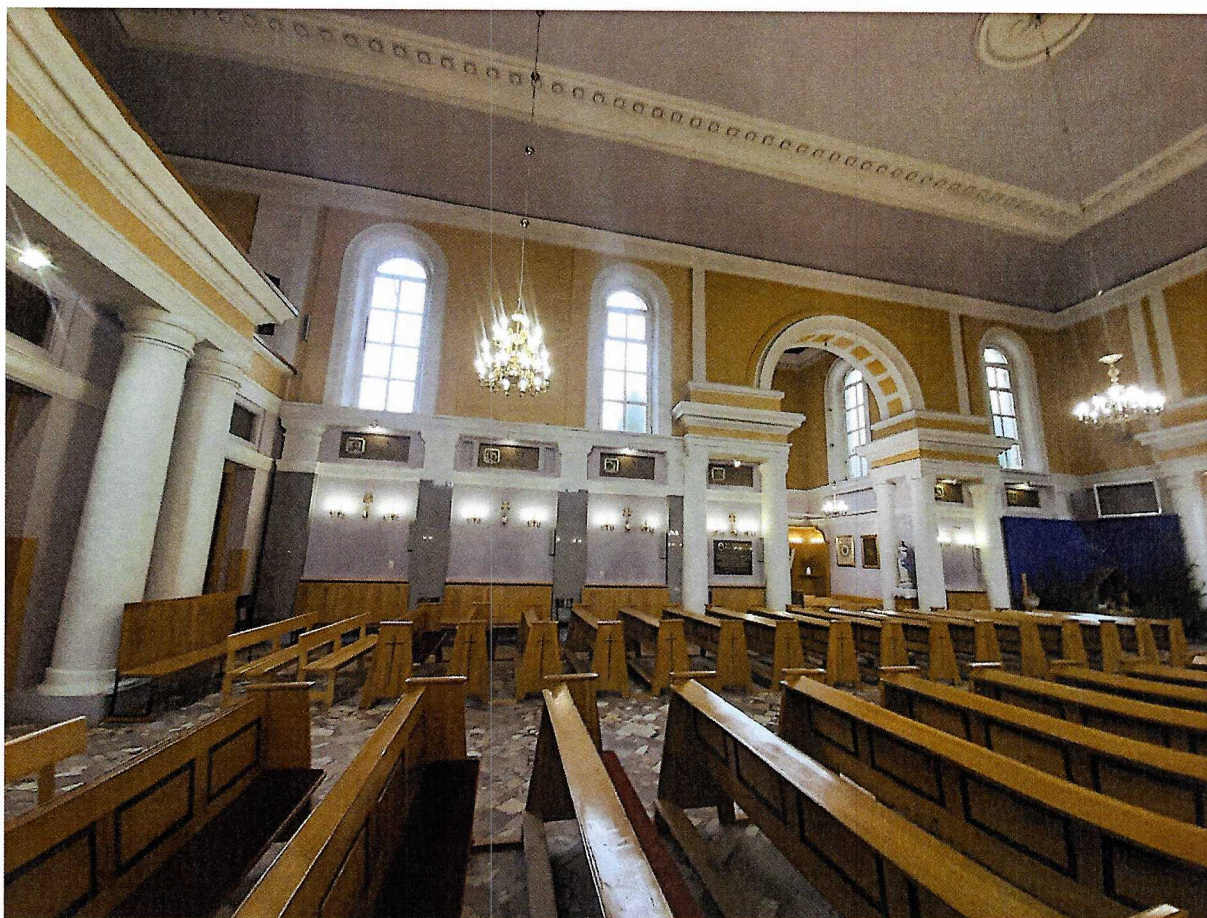

Fot. 5 Wnętrze kościoła. [styczeń, 2023r.]

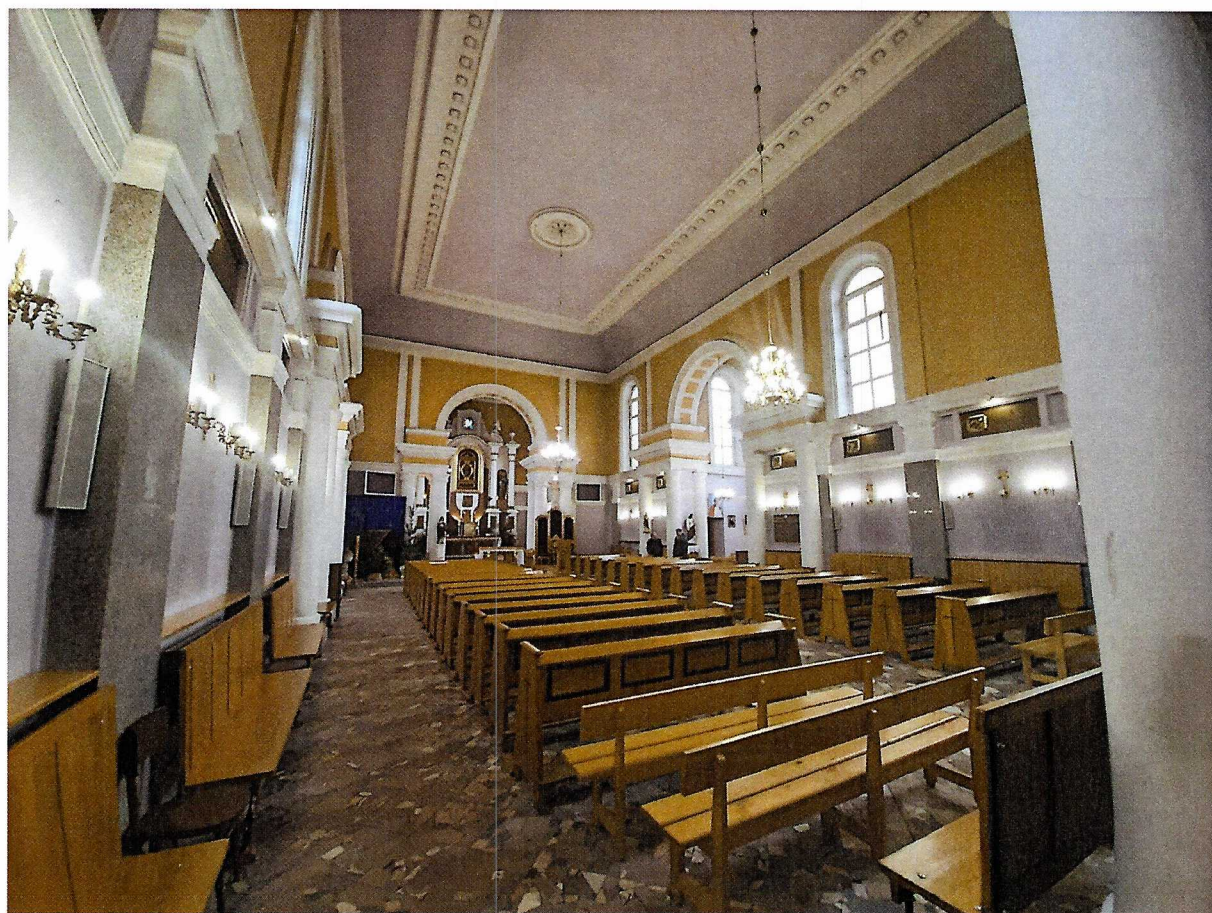

Fot. 6 Wnętrze kościoła. [styczeń, 2023r.]

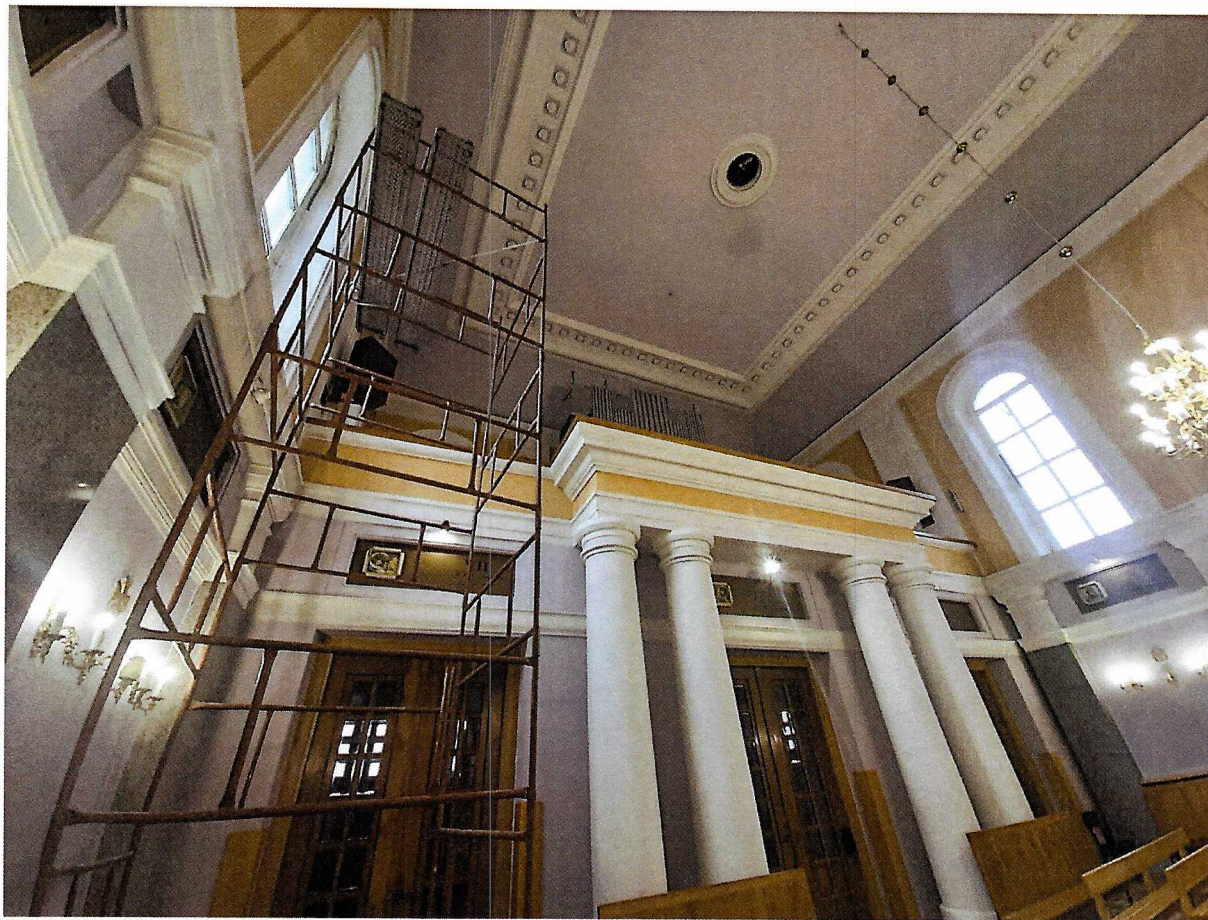

Fot. 7 Wnętrze kościoła. [styczeń, 2023r.]

2. ZAŁOŻENIA

2.2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

2.3. NAZWA INWESTYCJI – Remont wnętrza kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w m. Wiśniew, gm. Wiśniew.

2.4. LOKALIZACJA – budynek jest zlokalizowany na działce nr 697/2 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew.

2.5. USYTUOWANIE – usytuowanie istniejącego budynku nie ulega zmianie

2.6. ADRES INWESTYCJI : ul. Siedlecka 20, 08-112 Wiśniew

2.7. INWESTOR : Parafia Najświętszego Serca Jezusowego, ul. Siedlecka 20, 08-112 Wiśniew.

2.8. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren posiada zabudowę kubaturową w postaci budynku kościoła i ogrodu. Na działce znajdują się: krzyż, dzwonnica, utwardzenia oraz zieleni niska. Działka jest uzbrojona.

W ramach realizacji inwestycji nie przewiduje się żadnych zmian w zagospodarowaniu działki objętym niniejszym opracowaniem.

Urządzenia terenowe i uzbrojenie podziemne istniejące bez konieczności wprowadzania zmian.

2.9. UWARUNKOWANIA KONSERWATORSKIE

Budynek objęty opracowaniem wpisany jest do gminnego rejestru zabytków.

3. PROGRAM PRAC

Zamierzenie inwestycyjne polega na niezbędnych do utrzymania zabytku w należytym stanie - pracach remontowych wewnątrz budynku:

- naprawie zniszczonych tynków wewnętrznych
- scaleniu kolorystyki ścian
- pracach elektrycznych

Sposób wykonania przyjętych robót budowlanych:

Przed rozpoczęcie prac budowlanych teren inwestycji należy zabezpieczyć. Kościół na czas trwania robót będzie obiektem czynnym.

W miarę potrzeby usunąć fragmenty tynków o nieodpowiedniej przyczepności oraz fragmenty zawilgoconych tynków ścian.

Ze względu na zły stan tynku na suficie należy wykonać wzmocnienie powierzchni poprzez wykonanie gładzi renowacyjnej zbrojonej włóknem szklanym typu np. KEIM TURADO. Pozostałe tynki należy oczyścić ze starych powłok malarskich, pleśni i grzybów.

W istniejących odsłoniętych spękanalach muru należy zastosować siatkę metalową uzupełnioną tynkiem renowacyjnym.

Ubytki w elementach architektonicznych należy odtworzyć zaprawą tynkarską i nałożyć ostatnią warstwę jako gładź renowacyjna.

Istniejące detale architektoniczne należy oczyścić oraz zbić odspojone ich fragmenty, które należy później odtworzyć i wykonać w kształcie analogicznie do istniejących, za pomocą wcześniej wykonanego wzornika (odzwierciedlającego istniejące detale). Detale do otworzenia wykonać zaprawą wapienno-cementowego nakładanego warstwami: obrzutka, narzut (ilość warstw narzutu dostosować do grubości elementu, wg systemu i zaleceń producenta). Zaleca się stosowanie gotowej obrzutki i tynku należących do jednego systemu renowacyjnego wybranego producenta. Grubość jednej warstwy tynku powinna wynosić od 10 do 20 mm (w zależności od wytycznych producenta). Powierzchnię świeżo nałożonego tynku elementów architektonicznych przeciągnąć ostrą miotłą, szczotką z twardym włosiem lub pacą zębatą w kierunku poziomym w celu uszorstnienia powierzchni i poprawienia przyczepności dla kolejnej warstwy tynku. Ostatnią warstwę tynku wykończyć na gładko. Prace tynkarskie należy wykonywać w temperaturze od +5 do +25°C, a świeżą zaprawę zabezpieczać przed gwałtownym wysychaniem.

Malowanie

Po oczyszczeniu tynków ze starej farby, gzymsów, pleśni i dezynfekcji, należy wykonać malowanie tynków i elementów architektonicznych farbami paroprzepuszczalnymi silikatowymi (krzemianowymi), 2-krotnie, po uprzednim ich zagruntowaniu preparatami głęboko penetrującymi. Kolorystyka do uzgodnienia z WUOZ, po uprzedniej próbie malarskiej na placu budowy.

