ETAP III
Batalionów Chłopskich
Południowa
U-20b
B-1
Nie dotyczy pojazdów obsługujących budowę oraz mieszkańców
B-41
D-4a
B-33
30
A-14
Znak D-4a ustawić na wlocie skrzyżowania z ul. Ogrodową
Znak D-4a ustawić na wysokości działki nr 174
5.50
2.21
28-174
28-175
28-176
28-177
28-52
28-178/1
28-178/2
28-179/2
28-180
28-181
28-182/2
28-111/RV
28-183/3
28-184
28-191
28-196
28-197
28-198/1
28-198/2
28-199
28-110/RV
28-194/2
28-118/1

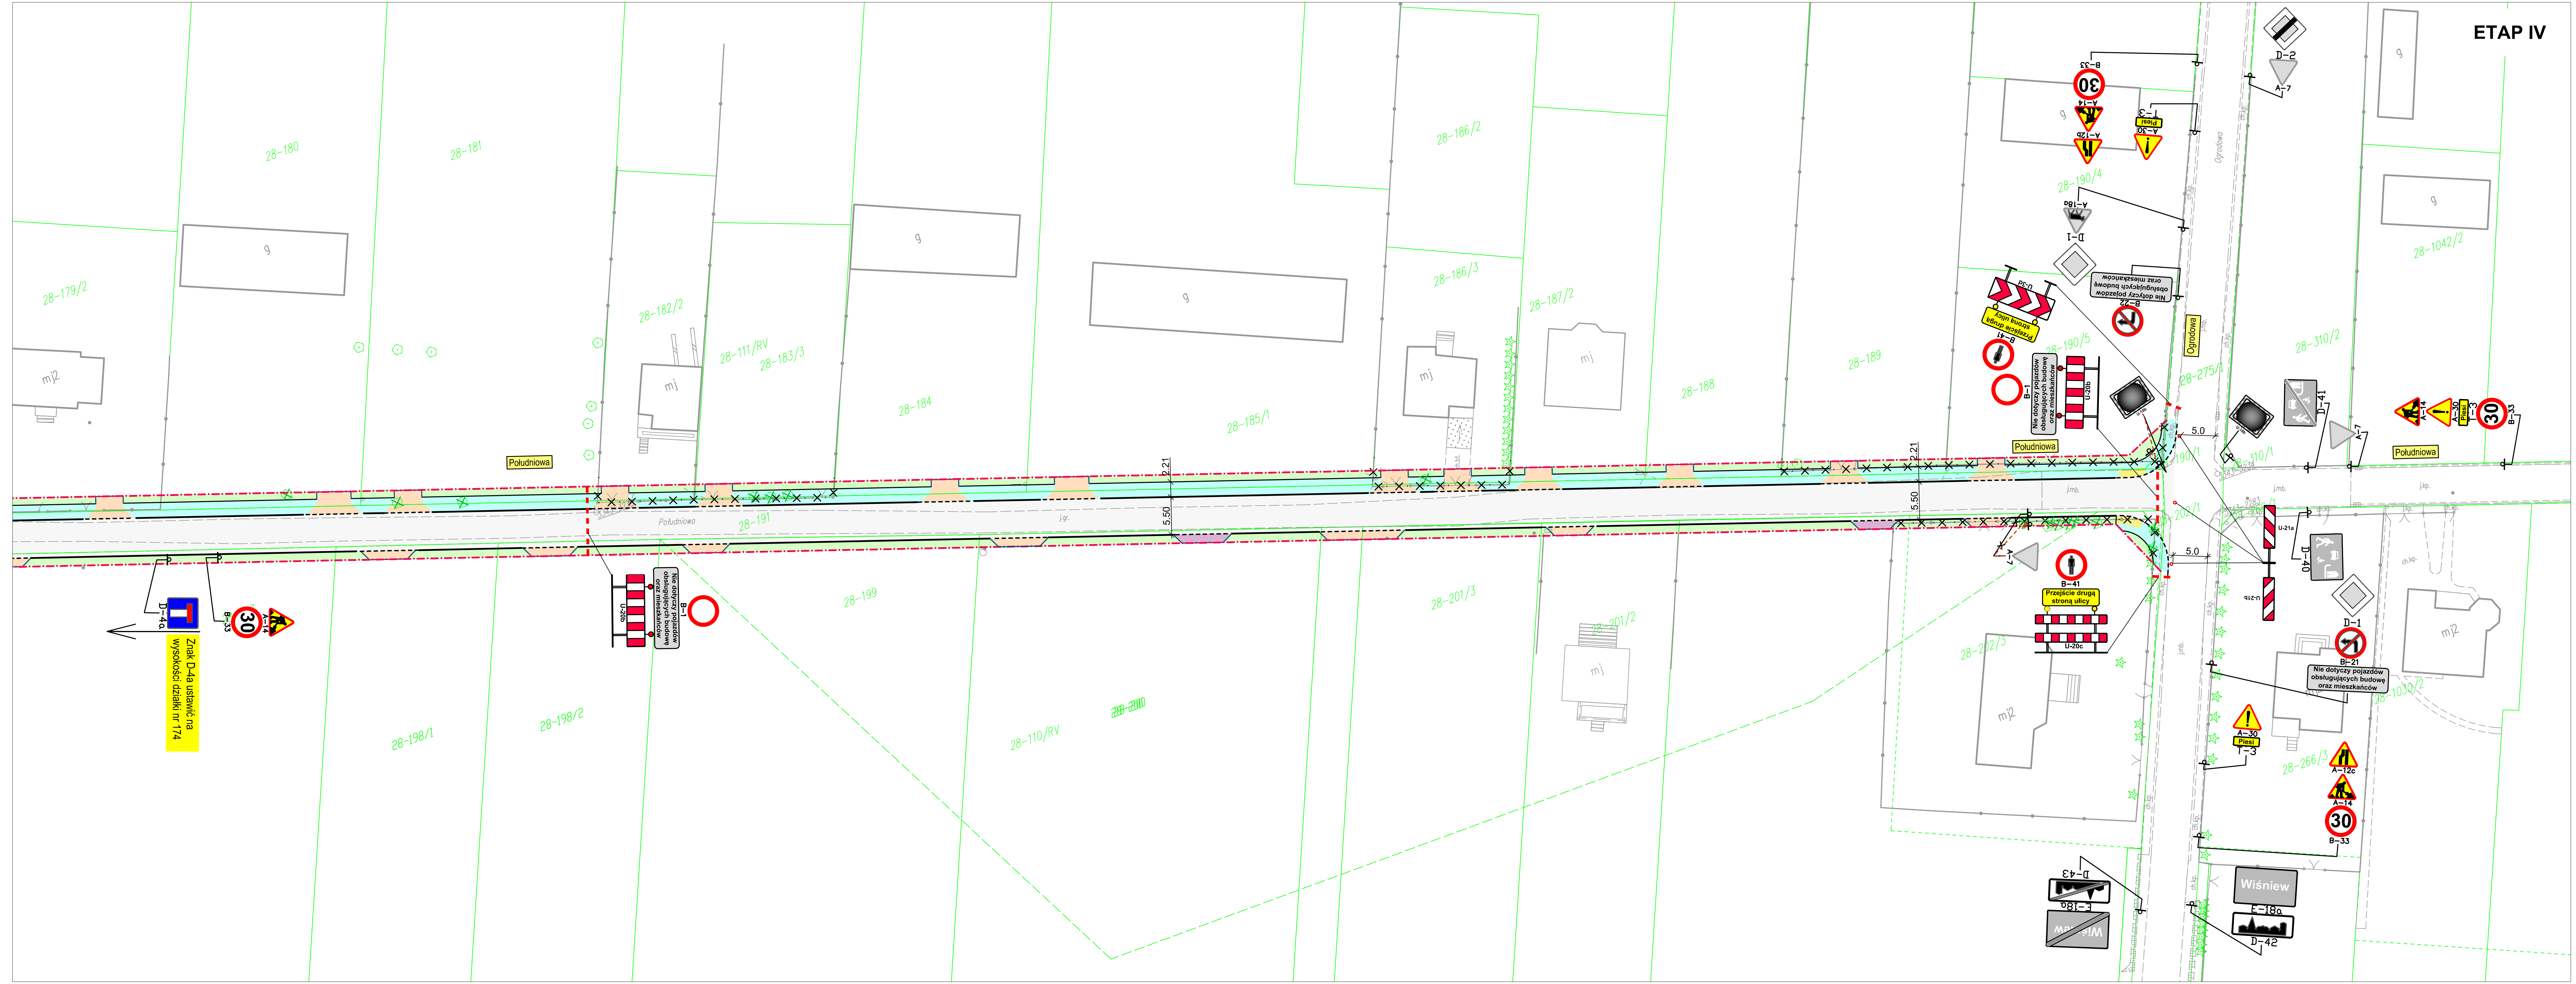
ETAP IV
Południowa
Ogrodowa
Przejście drugą stroną ulicy
Nie dotyczy pojazdów obsługujących budowę oraz mieszkańców
U-20b
U-20c
U-3d
U-21a
U-21b
B-1
B-41
B-22
B-21
B-33
30
A-14
A-12b
A-30
T-3
Piesi
A-7
A-18a
D-1
D-2
D-40
D-41
D-42
D-43
E-18a
Wiśniew
5.0
5.50
2.21
28-184
28-185/1
28-186/2
28-186/3
28-187/2
28-188
28-189
28-190/4
28-190/5
28-275/1
28-310/2
28-1042/2
28-201/3
28-201/2
28-202/3
28-266/3
28-1030/2
28-110/RV
28-199

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY
ETAP III i IV
SKALA 1:500

LEGENDA:

D-1	Istniejące oznakowanie pionowe
A-14	Projektowane oznakowanie pionowe
A-7	Istniejące oznakowanie pionowe do przestawienia
- - -	projektowane zapory drogowe

Projektowany układ drogowy

-·-·-	projektowane linie rozgraniczające pas drogowy
⬜	projektowane jezdnia (o nawierzchni bitumicznej)
🟧	projektowane pobocza (z kruszywa)
🟦	projektowane chodniki (z kostki betonowej szarej, gr. 6 cm)
🟧	projektowane zjazdy (z kostki betonowej grafitowej, gr. 8 cm)
🟪	projektowane zjazdy - dodatkowe (z kostki betonowej grafitowej, gr. 8 cm)
🟩	projektowane zieleńce
—	krawężniki (betonowe 15x30 cm)
- - -	krawężniki (betonowe 15x22 cm)
—	obrzeża (betonowe 6x20 cm)
—	obrzeża (betonowe 8x30 cm na ławie betonowej)
●	słupy oświetleniowe
✕ ✕	drzewa do wycinki
✕—✕—✕	ogrodzenia do rozbiórki

UWAGA:
W każdym momencie trwania prac budowlanych należy zapewnić możliwość bezpiecznego dojścia do posesji, a w miarę możliwości także dojazdu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym dodatkowo należy zabezpieczyć głębokie wykopy (>0,5m) ogrodzeniem szczelnym. W razie potrzeby należy stosować kładki dla pieszych U-28.

DROGOWIEC Sp. z o.o.

DROGOWIEC Sp. z o.o.
ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3; 15-333 Białystok
tel. 796 166 476; e-mail: biuro@spdrogowiec.pl
KRS 0000583625; NIP: 9662100389; REGON: 362887758

INWESTOR:	Gmina Wiśniew ul. Siedlecka 13 08-112 Wiśniew		
NAZWA OBIEKTU:	Rozbudowa drogi gminnej nr 361139W (ul. Południowa) w Wiśniewie na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną nr 361108W (ul. Kaczorowska) do skrzyżowania z drogą gminną nr 361104W (ul. Batalionów Chłopskich) wraz z budową infrastruktury technicznej		
STADIUM:	PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY		Nr rysunku: 3
NAZWA RYS.:	ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY - ETAP III i IV		Skala: 1:500
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: Branża/Projektant			Data: 05.06.2020
DROGOWA: mgr inż. Łukasz Milewski PDL/0098/POOD/11 PDL/BD/0030/12	Podpis	DROGOWA: mgr inż. Piotr Jakubecki PDL/0037/POOD/10 PDL/BD/0131/10	Podpis
DROGOWA: mgr inż. Paweł Sietejko PDL/0103/POOD/12 PDL/BD/0017/13	Podpis	DROGOWA: mgr inż. Paweł Grzybek PDL/0121/PBD/17 PDL/BD/0173/17	Podpis
